



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

**PROGRAMAS O PROYECTOS**  
**( CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS )**

**INFORME DE INVERSION DE OBRAS**  
**NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2019**




# UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato: SADS-DL-352-2016	
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	12 de junio del 2017
Fecha probable de culminación:	540 días de ejecución + Adenda de 200 días
Porcentaje de Avance:	78.20% de avance físico al mes de noviembre 2019



# REHABILITACION DE LA FISCALIA METROPOLITANA – ANTIGUO TE


Número de Contrato	N°SADS-DL-401-2019
Monto:	B/. 3,434,325.25
Contratista:	Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)
Orden de Proceder:	31 de Octubre del 2019
Fecha de culminación:	365 día calendario
Porcentaje de Avance:	3 % de avance Fase elaboración de planos.

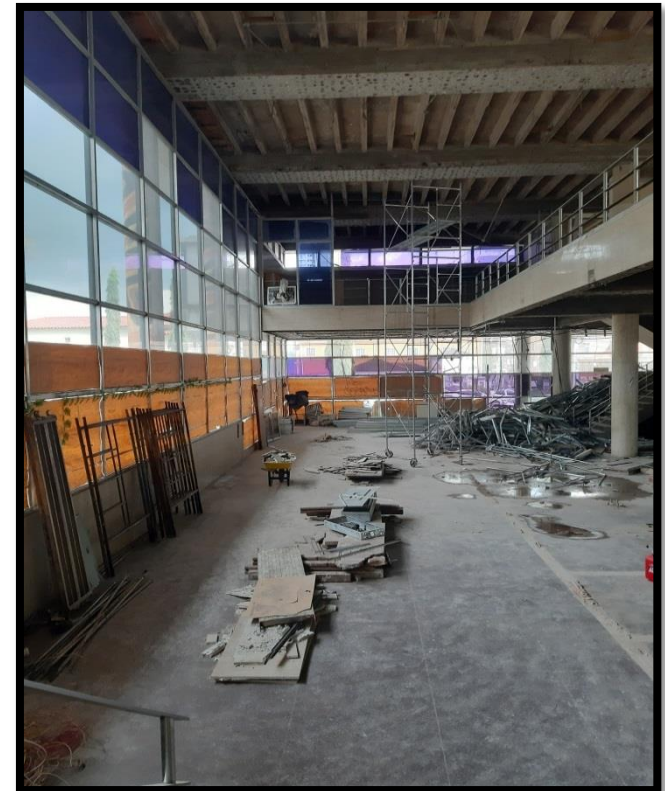



# REEMPLAZO DEL TECHO DE LA CASITA PORRAS – Incluye planos y aprobaciones

Número de Contrato:	OC # 4200211666
Monto de la Obra:	B/. 120,000.00
Contratista:	Building Services Corp.
Orden de Proceder:	11 de junio del 2019
Duración de los trabajos:	150 días calendario
Fecha de Culminación:	Trámites de aprobación de los planos en MUPA.
Porcentaje de Avance:	11.18% trabajos de demolición y limpieza del techo

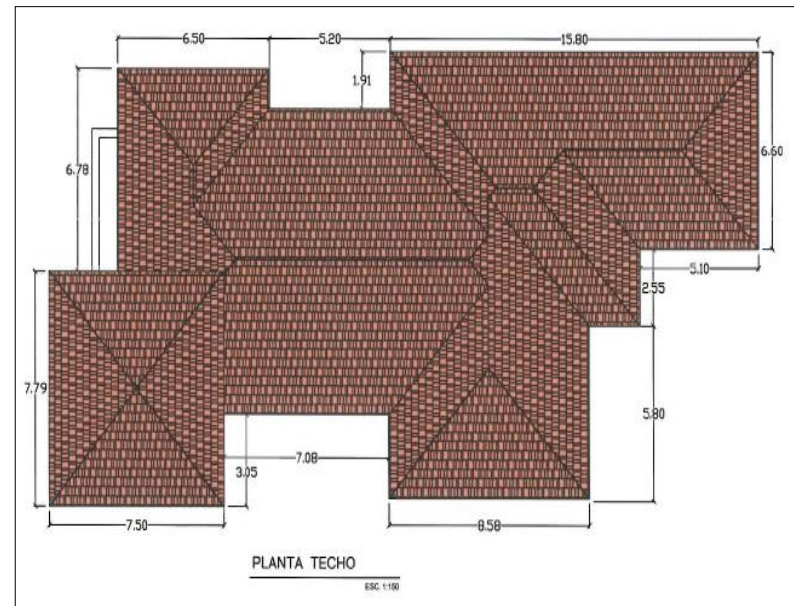



# CONSTRUCCIÓN DE LAS CERCAS DE CICLÓN PERIMETRALES DE LAS PERSONERÍAS DE PINOGANA Y TOLÉ

