



Procuraduría General de la Nación

Secretaría Administrativa

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AGOSTO 2019

CONSTRUCCIÓN EN AGENCIAS COMARCALES (PERSONERIA KANKINTU)

Número de Contrato:	SADS-DL-315-2016
Monto de la Obra:	B/. 205,975.00 Pago de Cta. # 5 por B/. 24,550.23 (10 de mayo del 2019)
Contratista:	Edificaciones y Servicios Múltiples, S.A.
Orden de Proceder:	3 de enero de 2017
Porcentaje de Avance:	100 % de avance físico, Acta de Aceptación Sustancial (24 de julio del 2018 - Aprobación del EIA.




CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE ALANJE

Número de Contrato:	SADS-DL-318-2016
Monto de la Obra:	B/. 225,500.00
Contratista:	Consorcio Pacífico - Mackenzie
Orden de Proceder:	15 de diciembre de 2016
Fecha de culminación:	30 de junio del 2019
Porcentaje de Avance:	La obra tiene un 100% de avance físico. Trámites para para aprobación el EIA



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE LAS PALMAS

Número de Contrato: SADS-DL-345-2016	
Monto de la Obra	B/. 244,800.00
Contratista	Constructora G.M, S.A.
Orden de Proceder	01 de febrero de 2017
Fecha de culminación	Acta de Aceptación Final el 11 de marzo 2019.
Porcentaje de Avance:	Avance Físico: 100% La DGCP determina la salida legal del Contrato para cierre del proyecto.

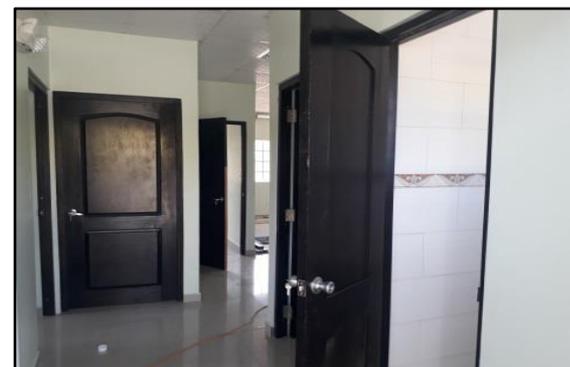

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE PEDASI

Número de Contrato: SADS-DL-343-2016	
Monto de la Obra:	B/. 217,000.00
Contratista:	Constructora G.M, S.A.
Orden de Proceder:	20 de febrero de 2017
Fecha probable de culminación:	El Tribunal de Contrataciones Públicas determina la Resolución Administrativa. La Aseguradora se subroga para reiniciar el proyecto. Resolución N° 061-2019-Pleno/TACP del 24 de abril del 2019.
Porcentaje de Avance:	La obra logró un 49.0 % de avance en la ejecución de los trabajos. A la espera de la nueva empresa que propondrá la Aseguradora para que termine el proyecto.



CONSTRUCCION DE LA UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ – Continuidad

Número de Contrato:	SADS-DL-352-2016
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	12 de junio del 2017
Fecha probable de culminación:	540 días de ejecución (Diciembre 2018) Adenda de 200 días (21 de junio 2019)
Porcentaje de Avance:	La obra refleja un 70.15 % de avance físico. Instalación de pisos, construcción de quicios en los arcos frontales y posteriores, ventanas del muro cortina , instalación de zócalos, instalación de inodoros de pared, instalación de estructura de cielo raso suspendido, instalación de Estaciones de Control del Sistema Contra incendio, alambrado eléctrico en el nivel 000 100 y 200



CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato:	SADS-DL-352-2016
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Monto Ejecutado 2017 + 2018	B/. 6,003,255.50
Monto Asignado 2019:	B/. 3,200,000.00
Saldo del contrato 2019:	B/. 7,196,264.50
Saldo Real Pendiente 2019	(B/. 3,996,264.50)
Cuentas presentadas al 31 de mayo 2019:	
Cuenta #13: (2019)	B/. 939,255.67
Cuenta #14: (2019)	B/. 702,809.00
Cuenta #15: (2019)	B/. 274,669.09
Cuenta #16: (2019)	B/. 103,360.70
Cuenta #17: (2019)	B/. 117,095.00
Cuenta #18: (2019)	B/. 1,162,820.30
TOTAL:	B/. 3,300,009.76



Órgano Judicial de Coclé



Caja de Seguro Social Coclé

CONSTRUCCIÓN DE LA I FASE DE LA FISCALÍA METROPOLITANA DE PANAMA

Número de Contrato:	SADS-DL-401-2019
Monto estimado de Obra:	B/. 3,434,325.25
Contratista:	Administración y Serpervisión de Obra Civiles, S.A.
Orden de Proceder:	En trámite de refrendo
Fecha de culminación:	360 días de ejecución
Acciones Realizadas:	<ul style="list-style-type: none">• Se licitó bajo la Licitación Pública N° 2019-0-035-0-08-LP-021067.• La apertura de propuestas fue el 17/05/2019.• En Resolución de Adjudicación 6/6/2019.

Se proyecta que la fase de diseño de la Fiscalía Metropolitana pudiera iniciar en octubre del 2019



PROPUESTA 1:
REHABILITACIÓN AL EDIFICIO DE LA UNIDAD METROPOLITANA
