



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMAS O PROYECTOS
(CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS)

INFORME DE INVERSIÓN DE OBRAS
SEPTIEMBRE 2020



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato: N°SADS-DL-352-2016

Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00

Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.

Orden de Proceder: 12 de junio del 2017

Fecha probable de culminación: 540 días de ejecución + Adenda de 200 días

Porcentaje de Avance: 88.39% de avance físico al mes de septiembre 2020.

Observación :

El 7 de septiembre del 2020 la Empresa Constructora retomó los trabajos, según el Decreto Ejecutivo N° 1036 de 4 de septiembre de 2020, para el Sector Construcción.



REHABILITACIÓN DE LA FISCALÍA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato N°SADS-DL-401-2019

Monto: B/. 3,434,325.25

Contratista: Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)

Orden de Proceder: 31 de Octubre del 2019

Fecha de culminación: 365 día calendario

Porcentaje de Avance: 13.08 % de avance en el desarrollo de Planos de construcción; mes de septiembre 2020.

Observación : El 7 de septiembre del 2020 la Empresa Constructora retomó las operaciones administrativas, según el Decreto Ejecutivo N° 1036 de 4 de septiembre de 2020, para el Sector Construcción.



PROPUESTA 1:
REHABILITACIÓN AL EDIFICIO DE LA UNIDAD METROPOLITANA



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE PEDASÍ

Número de Contrato N°SADS-DL-343-2016.

Monto:	B/. 217,000.00
--------	----------------

Contratista: Constructora G.M, S.A.


Observación :

La Compañía Seguros Suramericana, S.A., se subrogó en todos los derechos y obligaciones adquiridos por la empresa Constructora G.M., S.A., en virtud del Contrato SADS-DL 343-2016. A la espera del refrendo de la adenda.



I FASE PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD, CHIRIQUÍ-SEDE PROPIA

Número de Contrato	N°SADS-DL-421-2019
Monto:	B/. 925,550.00
Contratista:	OH INGENIERÍA, S.A.
Tiempo de Ejecución:	365 día calendarios
Alcance:	<p>Se programó el inicio de la construcción para la rehabilitación estructural del edificio sede que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aprobación de planos en las instancias gubernamentales. Demoler las dos (2) losas, según lo recomienda el estudio patológico. Construcción de cubierta de techo y refuerzo estructural.
Observación :	Contrato N° 421-2020 en trámite de perfeccionamiento.

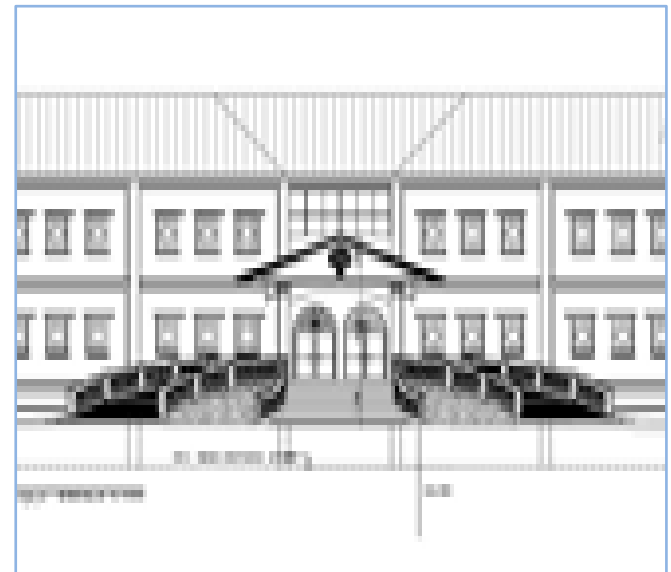

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COVID-19

- Servicio de Desinfección por nebulización Electrostática de los edificios del Ministerio Público en la Fiscalía Metropolitana de Panamá, Fiscalía Regional de San Miguelito, Fiscalía Regional Panamá Oeste, Fiscalía Regional de Colón.
- Servicio 24/7 de Sanitización de los Vehículos que realizan levantamiento de Personas fallecidas por casos de COVID-19.
- Contratación de una empresa para la desinfección con el método de Nebulización, para cuarenta (40) vehículos Institucionales del Ministerio Público.
- Compra de equipos nebulizadores para la jornadas de desinfección de las instalaciones del Ministerio Público.
- Compra de equipos nebulizadores para la jornada de desinfección de las instalaciones del Ministerio Público de las Coordinaciones Administrativas de Panamá Metropolitana.
- Servicio de alquiler y mantenimiento de sistemas de alfombras sanitizantes, con control de polvo y humedad para limpiar calzados después de ser sanitizados, para prevención del COVID-19.
- Compra de equipos de protección de desinfecciones para el personal de mantenimiento a nivel nacional.
